

---

## **Participación en el XVII Premio Nacional de Contraloría Social 2025**

### **Portada**

### **Título**

**“Vigilancia Ciudadana para Garantizar el Derecho al  
Agua”**

### **Nombre**

**Supervisión de la Construcción de la Ampliación de  
la Planta Potabilizadora Cunduacán a 350 LPS  
(Tercera Etapa)**

**\*\*Inversión de \$74,921,465.78 MXN\*\***

Cunduacán, Tabasco – Julio 2025

### **Primera Categoría:**

#### **Acciones de los Comités de Contraloría Social**

#### **Nombre de los Integrantes del Comité de Contraloría Social “Captación de Agua Samaria”:**


- José de los Santos Busquet García – *Presidente del Comité*
- Nidia Torres Arias – *Secretaria*
- Noé Pérez Hernández – *Tesorero*
- Flor de Liz Sánchez Vázquez – *1er. Vocal*
- Senaida Collado Torres – *2ndo. Vocal*
- Fernando Soto Revers – *Vocal de Control y Vigilancia*

## Contenido

<b>Portada .....</b>	<b>1</b>
<b>1. Acta de Constitución del Comité .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Acciones de Contraloría Social Realizadas .....</b>	<b>6</b>
<b>a) Capacitación del Comité .....</b>	<b>8</b>
<b>b) Solicitudes de Información Adicional.....</b>	<b>9</b>
<b>c) Recorridos de Obra .....</b>	<b>10</b>
<b>d) Informes, Quejas, Denuncias, Sugerencias y     Felicitaciones .....</b>	<b>14</b>
<b>e) Difusión a la Comunidad.....</b>	<b>14</b>
<b>3. Conclusiones .....</b>	<b>15</b>
<b>4. Anexos.....</b>	<b>18</b>

# 1. Acta de Constitución del Comité

Acta firmada por integrantes del comité y representantes de la instancia ejecutora, incluyendo fecha: **28 de junio de 2024.**



**COMISION ESTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)**  
**LOCALIDAD URBANA**

**Acta de Integración del Comité de Obra y Contraloría Social**

Localidad: Cabecera Municipal  
 Municipio: Cunduacán

Siendo las 12:30 horas, del día 28 del mes de Junio del año 2024, en el local que ocupa la Planta Potabilizadora en la localidad de la Cabecera Municipal, del municipio de Cunduacán, Tabasco, reunidos la mayoría de los habitantes de la comunidad arriba señalada, por la CEAS, los Carlos Arturo Flores Ligon Residente de la Obra, José Agustín Izquierdo Administrador Municipal, David Ferrnanda Tenorio Lopez Coordinador de Zona, Heura Martha Zetina Echeal Promotor Social, Victor Miguel Delva Vinasre Promotor Social Municipal, el C. \_\_\_\_\_, por la CONAGUA el C. José del Carmen Hernández López por la Secretaria de la Función Pública, y por la comunidad, el C. Estelita Zapata Frías, delegado municipal, en la cual se trató lo siguiente:

El representante de la dependencia ejecutora, da a conocer la obra consistente en la: AV069.- Construcción de la Ampliación de la Planta Potabilizadora Cunduacán a 350 lps, municipio de Cunduacán, Tabasco, Tercera Etapa, de Tres Etapas

En presencia de las autoridades municipales y beneficiarios se procede a informar a la comunidad sobre los trabajos que se realizan en la ejecución de la obra, los cuales consisten en: Obra Exterior, Caseta de Regulación, Caseta de tuberización eléctrica, Caseta de Planta de emergencia, Caseta de Central eléctrica, módulo


Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso que sea distinto a los establecidos en el programa.



TABASCO



MEDIO AMBIENTE



CONTRALORÍA SOCIAL

**COMISION ESTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)**

**LOCALIDAD URBANA**

La **CEAS**, se compromete en coordinación con el comité y autoridades municipales a brindar todos los apoyos que estos requieran en cuanto a la asesoría y ejecución de la obra.

1.- Es compromiso de la comunidad donar un terreno donde se ubicarán las instalaciones del servicio de Agua.

2.- Al término de la ejecución de la obra será compromiso y responsabilidad de la comunidad pagar su cuota mensual por los servicios de Agua.

Una vez explicado el programa y aceptado por la comunidad, bajo las condiciones anteriormente expuestas se procede a integrar el comité de obra, en forma democrática quedando de la siguiente manera:

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE:	José de los Santos Basquet Garcia	
SECRETARIO:	Nidia Torres Armas	
TESORERO:	Noe Pérez Hernández	
1ER. VOCAL:	Florencia de Luz Sánchez Vozquez	
2DO. VOCAL:	Serrana Colinda Torres	
V CTRL Y VIG:	Fernando Soto Pervers.	

**ACUERDOS**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_


"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



TABASCO



MEDIO AMBIENTE



CONTRALORÍA SOCIAL

**COMISION ESTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)**

**LOCALIDAD URBANA**

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente asamblea siendo las 14:00 hrs., del día 28, del mes de Junio, del año 2024 firmando al margen y al calce el acta, los que en ella intervinieron para dar fe y legalidad de la misma.

**AUTORIDAD DE LA COMUNIDAD**

C. Rosalva Zapata-Frías  
DELEGADO MUNICIPAL

**REPRESENTANTES DE LA CEAS**

Juan José Pérez de la Cruz  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

Santa Leticia Obedesman  
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Ing. José Aquino Zamudio  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Ing. Carlos Arturo Flores Ligerio  
RESIDENTE DE OBRA

Lic. David Fernando Tena López  
COORDINADOR DE ZONA

C. Herna Martha Zetina Irujo  
PROMOTOR SOCIAL



COMISION NACIONAL DEL AGUA  
CONAGUA

Victor Miguel Ochoa Viro  
PROMOTOR SOCIAL MUNICIPAL



CONTRALORIA DEL ESTADO  
SFP

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Ing. José del Carmen Hernández López  
*(Multiple signatures)*

---

## **2. Acciones de Contraloría Social Realizadas**

Somos habitantes del municipio de Cunduacán, ubicado en el corazón del estado de Tabasco, una región con profunda tradición agrícola, un fuerte arraigo comunitario y una población que ha vivido tanto los beneficios como los desafíos del desarrollo hídrico. Nuestro municipio, conformado por localidades urbanas y rurales, se ha consolidado como un eje importante en la vida social y económica del estado. Como ciudadanos comprometidos, hemos participado activamente en la defensa de nuestros derechos y en los procesos que fortalecen nuestra comunidad.

Nuestra economía local se basa principalmente en la agricultura, la ganadería, el comercio regional y algunas actividades derivadas del sector energético. Sin embargo, lo que más nos distingue es la organización comunitaria, el trabajo colaborativo y el esfuerzo colectivo que caracteriza a quienes vivimos aquí.

Nos enteramos de que la comunidad sería beneficiada con la ejecución de la obra de ampliación de la planta potabilizadora de Cunduacán a través de una invitación formal que nos hizo llegar la delegada municipal. Esta convocatoria fue dirigida a todos los ciudadanos interesados en formar parte del Comité de Contraloría Social, con el propósito de participar en la supervisión y seguimiento de dicha obra.

Como habitantes activos y comprometidos con el bienestar de nuestra comunidad, decidimos acudir a la reunión, ya que es común que participemos en los proyectos y beneficios que llegan a nuestra localidad.

Siempre buscamos sumar esfuerzos para mejorar nuestras condiciones de vida y contribuir al desarrollo comunitario. La necesidad de ampliar la planta potabilizadora surgió a raíz de múltiples quejas expresadas por los vecinos, quienes durante mucho tiempo reportaron problemas con la calidad del agua. Estos reportes constantes y justificados motivaron a las autoridades a buscar una solución de fondo. Fue así como se anunció la ejecución del proyecto de ampliación, con el objetivo de mejorar la distribución del agua y extender el servicio a otras zonas que también presentaban deficiencias en el suministro.

En este contexto, para nosotros, la construcción y ampliación de la planta potabilizadora de Cunduacán significó mucho más que una simple obra hidráulica. Fue una acción concreta que vino a garantizar el acceso justo, equitativo y digno al agua potable para miles de familias.

En este siglo XXI, el agua se ha convertido en un recurso estratégico como lo fue el petróleo en el siglo XX. Si antes se hablaba de la era del petróleo, hoy vivimos la era de la gestión responsable del agua: un recurso vital, escaso y fundamental para el desarrollo, la salud y la justicia social.

Aunque sabíamos de la existencia del Premio Nacional de Contraloría Social, nuestro interés no fue ese. Desde el inicio, nos enfocamos en lograr una obra de calidad.

Nuestra participación en el premio es una consecuencia natural del compromiso que asumimos con la comunidad y del trabajo constante que realizamos durante los 11 meses que duró la obra, de junio de 2024 a mayo de 2025.

A continuación, se describen las acciones más relevantes llevadas a cabo por el Comité de Contraloría Social en el seguimiento y vigilancia del proyecto:

---

### **a) Capacitación del Comité**

El día **28 de junio de 2024**, se llevó a cabo la **integración formal y capacitación del Comité**, donde se brindó información acerca de las funciones de vigilancia, canales de denuncia, y uso de formatos de seguimiento.

Fuimos elegidos de manera democrática en una reunión abierta convocada por la Secretaría de la Función Pública (hoy Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno) en coordinación con la empresa y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS).

Ahí, quienes teníamos interés y experiencia fuimos propuestos y aceptamos el compromiso. Sabíamos que no era una responsabilidad menor: se trataba de vigilar una obra de gran magnitud, con recursos importantes y un impacto directo en nuestras comunidades.

Nos enorgullece haber formado un comité con equidad de género: tres hombres y tres mujeres, todos con experiencia y con el deseo firme de aportar al desarrollo de Cunduacán.

Esta integración nos permitió complementarnos: mientras algunos compañeros aportaban conocimientos técnicos, las compañeras fueron clave en la observación minuciosa y en el seguimiento de detalles, lo cual fortaleció nuestra labor conjunta.

La ampliación de esta planta tuvo como objetivo responder a la creciente demanda de agua en nuestra región, asegurando no solo mayor cobertura, sino también calidad, continuidad y sostenibilidad del servicio. Pero además de la infraestructura, se requería de vigilancia y participación ciudadana, y por eso nos integramos como Comité de Contraloría Social.

*Evidencia fotográfica y documental: Se incluyen fotografías de la capacitación y lista de asistencia firmada en el apartado de anexos.*

---

## **b) Solicitudes de Información Adicional**

En los primeros días posteriores a la capacitación, el Comité solicitó formalmente a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) un **reporte técnico y financiero** de la obra. CEAS entregó un **informe detallado del proyecto**, incluyendo el calendario de ejecución, avances programados y desglose del monto del contrato, el cual asciende a **\$74,921,465.78 MXN**.

Desde el inicio buscamos que la comunidad estuviera informada. Solicitamos al contratista reportes claros, gráficos y mamparas informativas que nos permitieran comunicar el avance real y financiero de la obra a todos los vecinos. También promovimos la puntualidad y el orden en los recorridos, lo que facilitó la supervisión.

*Evidencia documental: Se incluye copia del reporte de obra entregado por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento en el apartado de anexos.*

---

## **c) Recorridos de Obra**

### **Recorrido del 16 de agosto de 2024**

Se visitó el sitio de construcción con el objetivo de verificar el avance físico reportado en la primera etapa. El comité constató la presencia de maquinaria y personal trabajando. Se hizo entrega del expediente al comité de Contraloría Social y **con un avance del 2%**, las partidas en proceso vigiladas por parte del comité fueron las siguientes:

- Construcción de Caseta de Vigilancia
- Construcción de Caseta de Subestación Eléctrica
- Caseta de Controles

A través de nuestras redes sociales, difundimos imágenes, datos y convocatorias para que más personas se sumaran y pudieran acompañarnos en los recorridos. Para nosotros, representar a la comunidad fue un honor, y siempre lo hicimos con respeto, transparencia y entusiasmo.

### **Recorrido del 20 de septiembre de 2024**

Durante este recorrido, se identificaron retrasos respecto al cronograma original. Se solicitó una explicación a CEAS, quien posteriormente presentó una justificación técnica.

Con un **avance** físico de la obra **del 4%**, las partidas en proceso vigiladas por parte del Comité de Contraloría Social fueron las siguientes:

- Construcción de caseta de vigilancia
- Construcción de caseta de la subestación eléctrica
- Caseta de controles
- Interconexión de medidor parshall a caja de operación
- Flocurador
- Arreglo mecánico
- Equipamiento de cárcamo
- Filtros

La relación con el contratista siempre fue cordial. Si bien hubo algunos retrasos, entendimos que se debieron principalmente al suministro de equipos especializados de alto valor. La obra civil visible era solo una parte del todo; lo más costoso y técnico estaba en los equipos nuevos, que requerían tiempos distintos de instalación.

Aun así, la empresa mostró disposición para informarnos y aclarar cualquier duda, siempre en un ambiente de diálogo respetuoso y constructivo.

#### **Recorrido del 18 de octubre de 2024**

A lo largo de éste recorrido de supervisión, se observó un **avance del 15%**. Los integrantes del Comité de Contraloría Social verificamos materiales empleados y el cumplimiento de medidas de seguridad para los trabajadores de la obra.

Constatamos que los edificios del proyecto ya se encontraban en proceso de ejecución y debido a las condiciones climáticas del día — particularmente el calor intenso—, Iniciamos la revisión resguardándonos bajo la sombra de un árbol cercano al sitio de obra.

Las partidas en proceso vigiladas por parte del comité fueron las siguientes:

- Construcción de Caseta de Vigilancia
- Construcción de Caseta de Subestación Eléctrica
- Caseta de controles
- Interconexión de Medidor parshall a caja de operación
- Floculador
- Arreglo Mecánico
- Equipamiento de Cárcamos
- Suministro de piezas especiales

Posteriormente, retomamos el recorrido en la zona superior de la planta, la misma que habíamos supervisado anteriormente. En esta visita también se observaron nuevas construcciones en la parte posterior de la planta, las cuales ya habían sido autorizadas y estaban en sus primeras etapas de ejecución.

Pudimos verificar que en algunos puntos se estaban llevando a cabo los trabajos de desplante y cimentación. Durante esta inspección, se prestó especial atención a la instalación de arrancadores, la planta de emergencia y demás equipos técnicos relacionados con la infraestructura de los dos nuevos edificios en construcción.

Este recorrido permitió al Comité constatar el avance físico de la obra, así como verificar que se estaban siguiendo los procedimientos técnicos correspondientes, cumpliendo con lo estipulado en el proyecto original y en las ampliaciones autorizadas.

### **Recorrido del 30 de enero de 2025**

En este recorrido, se documentó un **avance cercano al 65%**. El comité verificó la instalación de equipos de potabilización y redes hidráulicas. Estaba previsto que finalizara en este periodo, pero se solicitaron dos prórrogas de un mes cada una. Durante todo el proceso actuamos como un verdadero canal de comunicación entre la ciudadanía y los ejecutores. Recibíamos quejas, sugerencias o dudas, y las trasladábamos a las reuniones, donde se nos daban respuestas claras.

Esto generó confianza en la población y reforzó el sentido de transparencia. También hicimos observaciones sobre el orden y la limpieza dentro del área de obra, siempre desde el respeto y con el objetivo de mejorar.

### **Recorrido de entrega del 09 de mayo de 2025**

Cuando elaboramos el **informe final el 9 de mayo**, lo hicimos con la satisfacción de haber cumplido con éxito nuestra labor. Los recorridos fueron organizados, informativos y participativos. A veces bajo el lodo, a veces bajo el sol, siempre estuvimos presentes, interesados y colaborativos.

Incluso en ocasiones, convivimos después de las reuniones con un refrigerio o pastel que amablemente se compartía, no como un incentivo, sino como una forma de fomentar la cercanía y el compañerismo. Aprovechamos la fecha para reconocer a las compañeras del comité con motivo del Día de las Madres, lo que cerró con alegría y unidad nuestra participación.

*Evidencia: Se incluyen fotografías de cada recorrido, informes de observaciones, listas de asistencia y reportes de seguimiento en el apartado de anexos.*

---

#### **d) Informes, Quejas, Denuncias, Sugerencias y Felicitaciones**

Durante la supervisión, el Comité canalizó dos **sugerencias ciudadanas** a CEAS:

1. Solicitud de establecer señalamientos en la zona de obra por seguridad vial.
2. Solicitud de reportes gráficos para conocer el avance financiero para tener un parámetro real.

Ambas fueron **atendidas y ejecutadas** por la instancia ejecutora (CEAS)

#### **e) Difusión a la Comunidad**

Con el fin de garantizar transparencia y participación ciudadana, el Comité implementó las siguientes acciones de difusión:

- **Publicaciones en redes sociales comunitarias (Facebook y WhatsApp):** se compartieron fotos, avances de obra, y convocatorias a recorridos abiertos.
- **Reuniones vecinales:** se organizaron 2 reuniones (septiembre y noviembre de 2024) para informar sobre los avances y escuchar opiniones de la población.

*Evidencia: Capturas de redes sociales y fotografías de reuniones en el apartado de anexos.*

---

### 3. Conclusiones

Sabemos que la percepción de la comunidad fue positiva: reconocieron la calidad de la obra y su importancia regional. También comprendimos que, para que el beneficio sea completo, se debe mejorar la red de distribución, porque la calidad del agua no solo depende de la planta, sino también del estado de las tuberías.

Esta es una tarea que aún está pendiente, pero ahora contamos con mayor claridad sobre los retos que implica y el camino que se debe seguir para resolverlos.

El diálogo abierto con los usuarios nos permitió identificar otras necesidades vinculadas a la operación del sistema, y eso nos motiva a seguir participando de manera activa en futuras decisiones. Participar como comité fue una experiencia enriquecedora.

Aunque algunos de nosotros ya habíamos estado en otros comités, nunca habíamos supervisado una obra de este tamaño.

Esta fue una oportunidad valiosa de aprendizaje colectivo: comprendimos cómo se estructura un contrato público, cómo se aplican los recursos federales, y cuáles son los mecanismos de control y evaluación que se deben cumplir.

Más allá del contenido técnico, aprendimos también a comunicarnos de forma más clara con la ciudadanía, a resolver diferencias de opinión con respeto y a fortalecer nuestra capacidad de organización comunitaria.

Nos sentimos orgullosos de haber contribuido, de haber generado confianza en nuestra comunidad, y de haber demostrado que la vigilancia ciudadana es clave para lograr obras bien hechas, con recursos bien utilizados y con resultados palpables.

A través de nuestro trabajo como comité, no solo se cumplió una obligación normativa; también se promovió una cultura de corresponsabilidad entre gobierno y sociedad, que fortalece la democracia desde lo local.

Esta obra no solo nos deja una planta funcional y moderna. Nos deja también una comunidad más unida, más participativa, y con la convicción de que cuando nos organizamos, podemos lograr cosas importantes.

Hoy sabemos que la transparencia no se logra sola: necesita del compromiso de quienes, como nosotros, decidimos aportar nuestro tiempo y esfuerzo para el bien común.

Nuestra experiencia reafirma que la participación ciudadana no es solo un derecho, sino también una responsabilidad ética con nuestro entorno.






El Comité de Contraloría Social logró mantener una vigilancia constante, participativa y documentada, garantizando el cumplimiento del contrato y promoviendo la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Este acompañamiento permanente, realizado con compromiso y honestidad, fue fundamental para alcanzar los resultados obtenidos. Esta experiencia fortalece la confianza ciudadana y promueve el derecho humano al agua en el municipio de Cunduacán, Tabasco.

**Esperamos que este trabajo inspire a otras comunidades a involucrarse activamente en la supervisión de las obras públicas**, porque cuando la sociedad se involucra, la calidad y el impacto de las acciones se multiplican. La contraloría social no solo vigila: también construye ciudadanía, y deja una huella duradera en el desarrollo de nuestras comunidades.

## 4. Anexos

- Lista de asistencia
















**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
LOCALIDAD URBANA**

**LISTA DE ASISTENCIA**

**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**

Firma de asistentes a la asamblea realizada el día 28 del mes Junio del año 2024, en la Cabecera municipal del municipio de Cunduvarca, Tabasco; con la finalidad de Realizar Asamblea para integrar el comité de obra y Contraloría Social.

NOMBRE	FIRMA
<u>Dard de la cruz pere</u>	
<u>Bor-tola Zapata frias</u>	
<u>Flore beliz Sánchez Uribe?</u>	
<u>Fernando Soto Braveros</u>	
<u>ENRIQUE OSORIO BROCA</u>	
<u>Gabriela Salgado Osorio González</u>	
<u>Aquileo López Alejandro</u>	<u>ALA</u>
<u>Carlos Hugel Sánchez Méndez</u>	
<u>San Antonia Sánchez Méndez</u>	
<u>Noé Rog Hernández</u>	

• **Reportes de obra entregados por CEAS**



**REPORTE DE OBRA**


<b>Obra:</b>	Construcción de la Ampliación de la Planta Potabilizadora	<b>Contrato:</b>	CEAS-PROAGUA-003/2024
<b>Localidad:</b>	Cunduacán a 350 LPS, (Tercera Etapa).	<b>Fecha Programada de Inicio:</b>	01 de Julio del 2024
<b>Municipio:</b>	Cunduacán, Tabasco.	<b>Fecha Programada de Término:</b>	17 de Diciembre del 2024
<b>Fuente de Recursos:</b>	Federal y Estatal	<b>No. de Proyecto:</b>	AU069
<b>Monto de Contrato:</b>	\$ 74,921,465.78	<b>Ejercicio:</b>	2024
<b>Contratista:</b>	Grupo AM Construcciones, S.A de C.V.	<b>Población Beneficiada:</b>	21,003 Habitantes
<b>Residente:</b>	Ing. Carlos Arturo Flores Ligonio		

**Descripción del Proyecto:**

#	Descripción	Importe	%
1	OBRA EXTERIOR	\$ 18,075.68	0.02
2	CASETA DE VIGILANCIA	\$ 59,929.36	0.07
3	CASETA DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	\$ 78,932.92	0.11
4	CASETA DE PLANTA DE EMERGENCIA Y CUARTO DE CONTROL ELÉCTRICO	\$ 95,596.01	0.13
5	MÓDULO DE BAÑO		
6	INTERCONEXIÓN DE MEDIDOR PARSCHALL A CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULA TIPO ESPECIAL.	\$ 291,559.46	0.39
7	ARREGLO MECÁNICO PARA CÁRCAMO Y LINEA DE LODOS AL PARSHALL	\$ 63,224.00	0.08
8	FLOCULADOR (INSTALACIÓN)	\$ 279,909.35	0.37
9	SEDIMENTADOR (INSTALACIÓN)	\$ 74,410.01	0.10
10	CLORACIÓN, REDES DE DOSIFICACIÓN Y REACTIVOS -CLORACION.- -PRECLORACION.- -PARSHALL 1 Y 2	8,420,646.21	11.24
11	ARREGLO MECÁNICO DE CISTERNA A COMALCALCO	\$ 615,737.58	0.82
12	LECHO DE SECADO		
13	CONSTRUCCIÓN DE REJACERO.		
14	SISTEMA ELECTRICO EN LA PLANTA		
15	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO (3RA ETAPA)	\$ 336,543.40	0.45
16	EQUIPAMIENTO DE CISTERNA DE BOMBEO EN PLANTA POTABILIZADORA (3RA ETAPA)		
17	FILTROS	\$ 1,493,222.18	2.00
18	CONSTRUCCION DE LINEA DE DESCARGAS DE LODOS CARCAMO - REGISTRO		
19	SISTEMA DE NEUTRALIZACIÓN		
	<b>TOTAL PLANTA</b>	<b>\$ 11,827,786.14</b>	<b>15.79%</b>

**RESIDENTE DE OBRA**  
 Av. Paseo de la Sierra, Núm. 402, Col. Reforma,  
 91450 6063 / 3 13 66 00 ext. 2933  
 Villahermosa, Tabasco, México  
 construccion\_ccastabasco@hotmail.com  
<http://ceas.tabasco.gob.mx>

**Informes de recorridos: evidencia fotográfica y videográfica**

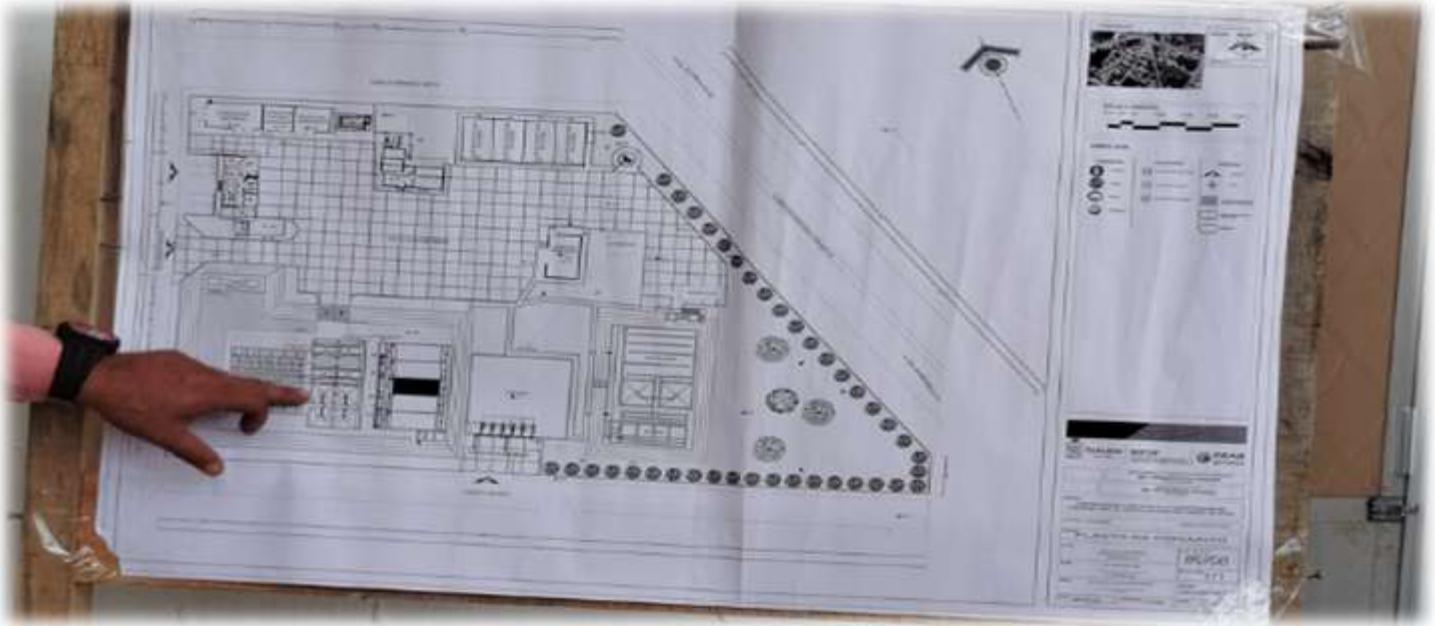

**Escrito libre de constitución de comité de contraloría social:**



**ANEXO 1: ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL / ESCRITO LIBRE**

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)**

**EJERCICIO FISCAL 2024**

Fecha de constitución: 28/06/2024

<b>Nombre del Comité de Contraloría Social</b>	<u>Aqua Fuente de Vida</u>
<b>Clave del Comité asignada por la Instancia Normativa del Programa</b>	<u>CCS-2024-5074-TAB-006-0001-01</u>
<b>¿El Comité de Contraloría Social fue constituido en años anteriores? Sí No</b>	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No

Domicilio donde se constituye el Comité	
<b>Entidad federativa:</b>	<u>Tabasco</u>
<b>Municipio:</b>	<u>Cunduacán</u>
<b>Localidad:</b>	<u>Cabecera Municipal</u>
<b>Calle:</b>	<u>Av. Jalpa</u>
<b>Número:</b>	<u># 19</u>
<b>Colonia:</b>	<u>Cunduacán 2000</u>
<b>Código Postal:</b>	<u>86690</u>

Datos del beneficio a vigilar	
<b>Nombre del beneficio:</b>	<u>AUG69.- CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN A 350 LPS, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (TERCERA ETAPA DE TRES ETAPAS)</u>
<b>Tipo de beneficio:</b>	Apoyo: <input type="checkbox"/> Obra: <input checked="" type="checkbox"/> Servicio: <input type="checkbox"/> Otro: <input type="checkbox"/>
<b>Número de personas beneficiarias:</b>	Hombres: <u>11</u> Mujeres: <u>11</u> Total: <u>22</u>
<b>Entidad federativa:</b>	<u>Tabasco</u>
<b>Municipio:</b>	<u>Cunduacán</u>
<b>Localidad:</b>	<u>Cabecera Municipal</u>
<b>Comentarios:</b>	
<b>Presupuesto asignado al beneficio:</b>	<u>\$ 74,921,465.78</u>
<b>Fecha de ejecución del beneficio:</b>	<u>1/julio/2024 al 17/diciembre/2024</u>

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Integrantes del Comité de Contraloría Social	
Nombre completo:	Jose de las Contas Busquet Garcia
Sexo:	Hombre
Edad:	56 años
Cargo del integrante:	Presidente
Correo electrónico:	N/A
Teléfono (incluirla):	9141182090
Firma:	
Nombre completo:	Nidia Torres Aras
Sexo:	Mujer
Edad:	53 años
Cargo del integrante:	Secretaria
Correo electrónico:	N/A
Teléfono (incluirla):	9141078805
Firma:	
Nombre completo:	Ngé Pérez Hernández
Sexo:	Hombre
Edad:	67 años
Cargo del integrante:	Tesoroero
Correo electrónico:	N/A
Teléfono (incluirla):	9933450957
Firma:	
Nombre completo:	Florencia Sánchez Vázquez
Sexo:	Mujer
Edad:	48 años
Cargo del integrante:	1er Vocal
Correo electrónico:	N/A
Teléfono (incluirla):	9141197784
Firma:	
Nombre completo:	Genaida Collado Torres
Sexo:	Mujer
Edad:	59 años
Cargo del integrante:	2da. Vocal
Correo electrónico:	N/A
Teléfono (incluirla):	993311499
Firma:	

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



**LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL DE MANERA LIBRE Y VOLUNTARIA PODRÁN**

<b>Nombre completo:</b>	Fernando Soto Revers
<b>Sexo:</b>	Hombre
<b>Edad:</b>	70 años
<b>Cargo del integrante:</b>	Vocal de Control y Vigilancia
<b>Correo electrónico:</b>	N/A
<b>Teléfono (incluir lada):</b>	914108 3320
<b>Firma:</b>	

**REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:**

- I. Solicitar a la Instancia Normativa, Oficina de Representación Federal o a las instancias ejecutoras la información pública relacionada con la operación del programa federal;
- II. Vigilar que:
  - a) Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa federal.
  - b) El ejercicio de los recursos públicos para los beneficios otorgados por el programa federal sea oportuno, transparente, observante de las reglas de operación y, en su caso, de la normativa aplicable.
  - c) Las personas beneficiarias del programa federal cumplan con los requisitos de acuerdo con la normativa aplicable.
  - d) Se cumpla con los periodos de ejecución y entrega de los beneficios.
  - e) Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de los beneficios.
  - f) El programa federal no se utilice con fines políticos, electorales, de promoción personal, de lucro u otros distintos al objeto del programa federal.
  - g) El programa federal se ejecute en un marco de igualdad entre mujeres y hombres.
  - h) Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas con el programa federal.
- III. Elaborar informes de los resultados de las actividades de operación de la contraloría social realizadas, así como dar seguimiento, en su caso, a los mismos, y
- IV. Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los programas federales, recabar la información de estas y canalizarlas a las autoridades competentes para su atención.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

**MECANISMOS E INSTRUMENTOS QUE UTILIZARÁ PARA EL EJERCICIO DE SUS ACTIVIDADES:**

Acta de integración de Comité de Contraloría Social, Ficha Técnico- Financiero, Avances Físicos Financieros, Minutas, Informes mensuales – trimestrales, catálogo de concepto.

**DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA CALIDAD DE BENEFICIARIO:**

(INE)

<b>Datos de la persona servidora pública que apoya en la constitución del Comité</b>
<b>Nombre:</b> Lic. María del Carmen Martínez Gómez
<b>Cargo:</b> Enlace de Contraloría Social
<b>Firma</b>

ESCRITO POR EL QUE EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL SOLICITA SU REGISTRO ANTE EL PROGRAMA

Los Integrantes del Comité expresamos nuestra voluntad de llevar a cabo las actividades de contraloría social durante el **ejercicio fiscal 2024**, por lo que asumimos el presente documento como escrito libre para solicitar el registro conforme a los dispuesto en el artículo 70 del reglamento de la Ley General de Desarrollo Social.

**Aviso de privacidad:** Tiene el firme propósito de hacer del conocimiento del Titular de los datos personales que la información recabada será utilizada para los fines del tratamiento al que por ello se le solicitaron, y para mayor información acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer consultar el aviso de privacidad en la dirección electrónica siguiente: <https://tabasco.gob.mx>

Handwritten signatures and official stamps from the Ayuntamiento Constitucional of Cunduacán, Tabasco. The stamps include the text: "AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUNDUACÁN", "CASA CUNDUACÁN", "2400 (SECTOR DELEGACIÓN MUNICIPAL)", and "FRACC. SAN ANTONIO DELEGACIÓN MUNICIPAL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN TABASCO".


"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



TABASCO



MEDIO AMBIENTE



**LISTA DE ASISTENCIA**



CONTRALORÍA SOCIAL

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2024(PROAGUA):

// Seleccionar el tipo de localidad //

Localidad Urbana

Localidad Rural

Fecha:

28/06/24

EVENTO POR LOCALIDAD:

Constitución del Comité

Reunión con Beneficiarios

Capacitación a integrantes del Comité

Ubicación del evento:

Estado:

Tabasco

Municipio:

Cunduacan

Localidad:

Cabecera Municipal

Participantes:

Nombre	Firma
<u>Cynthia Janet Hdez Carlos</u>	
<u>Mari Ernestina Velazquez Rodriguez</u>	
<u>Yanuario Euan C.</u>	
<u>Alexda Marín Morales</u>	<u>A. M. M.</u>
<u>Adelita GOMEZ RUIZ</u>	<u>A G R</u>
<u>Nidia TORRES ARIAS</u>	
<u>Sensida Collado Torres</u>	
<u>Leonor Navarrete Castellanos</u>	<u>Leonor Navarrete G</u>
<u>Rosa Pérez Jiquiera</u>	
<u>José Dolores Santos Busquet G.</u>	

Promotora de Contraloría Social

Sensida collado Torres

Nombre y firma de una o de un integrante del Comité de Contraloría Social

Datos de contacto:

Teléfono:

9933-13-66-00 ext 502

Correo electrónico

[direccióndesarrollosocialceas@hotmail.com](mailto:direccióndesarrollosocialceas@hotmail.com)

Domicilio institucional

Calle: Benito Juárez # 115-B, Col. Reforma, Villahermosa, Tabasco.

Datos de contacto: (Que apliquen)

Teléfono: 9933 111449

Correo electrónico: N. D.

Domicilio: Cabecera Municipal Cunduacan

- Fotografías de cada etapa

**Constitución del Comité de Contraloría Capacitación 28 de junio 2024**



**Recorrido de Obra del 16 de agosto 2024**





### Entrega del Expediente al Comité de Contraloría Social



### Recorrido de Obra del 20 de septiembre 2024



**Recorrido de obra del 18 de octubre 2024**












**Recorrido de obra del 30 de enero del 2025**








**Recorrido de Informe Final 9 mayo 2025**





### Publicaciones en redes sociales









Material Digital entregado a la comunidad (se anexan 6 videos)

